

**Referat**      **Amt**  
VI              242-3      GUD

**Tel. Nr.:**  
09131/86- 1694

## **Stand der Umsetzung des Schulsanierungsprogramm 2007-2015 sowie des Konjunkturförderprogramms 2009-2011**

Beratungsfolge	Termin	öff.	nöff.	Vorlagenart	Abstimmungsergebnis		
					einstimmig	für	gegen Prot.verm.
StR	10.12.2009	X		Beschluss	X	48	0

Beteiligte Dienststellen

### I. **Antrag**

Der Stadtrat nimmt den Bericht des Gebäudemanagements über den Stand der Umsetzung des Schulsanierungsprogramms sowie des Konjunkturförderprogramms (Bereich Schulen) zur Kenntnis.

### II. **Begründung**

#### 1. **Ergebnis/Wirkungen**

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Durch die Umsetzung des Schulsanierungsprogramms sollen bis 2015 die räumlichen Bedingungen für die Schülerinnen und Schüler verbessert und der Schulstandort Erlangen aufgewertet werden. Die Maßnahmen des Konjunkturförderprogramms sind dabei bereits bis 2011 abzuschließen.

#### 2. **Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen**

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Gemäß StR-Beschluss vom 30.5.2008 wurde das Schulsanierungsprogramm von ursprünglich 25 auf 48,5 Millionen aufgestockt.


In dem von der Regierung am 2. März 2009 aufgelegten Konjunkturförderprogramm „Förderung von Maßnahmen für die energetische Modernisierung der Infrastrukturen in den Kommunen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz“ werden über das **Konjunkturpaket II** sowie **Investitionspakt 2009**


- 3 zusätzliche Maßnahmen – Hermann-Hedenus-Schule, Turnhalle, Büchenbach-Dorf, Turnhalle sowie Werner-von-Siemens-Realschule, Turnhalle – gefördert sowie
- der Sanierungsumfang von 3 bereits im Schulsanierungsprogramm beinhalteten Maßnahmen – Hermann-Hedenus-Hauptschule, Sonderpädagogisches Förderzentrum II, Turnhalle sowie Grundschule Tennenlohe – ausgeweitet.

Im Folgenden werden die Maßnahmen mit Kostenstand Ende 2009 aufgelistet:

	Schulsanierungsprogramm 2007-2015		Konjunkturförderprogramm 2009-2011		Gesamtbaukosten
Grundschule Tennenlohe	736.000 €	+	976.151 €	=	1.712.151 €
Hermann-Hedenus-Grundschule	2.679.000 €		---	=	2.679.000 €
Hermann-Hedenus-Hauptschule	1.648.000 €	+	491.000 €	=	2.139.000 €
Hermann-Hedenus-Turnhalle	---	+	1.550.000 €	=	1.550.000 €
Friedrich-Rückert-Schule	3.079.000 €		---	=	3.079.000 €
Marie-Therese-Gymnasium, Schulgebäude	2.651.000 €		---	=	2.651.000 €
Marie-Therese-Gymnasium, Turnhalle	1.234.000 €		---	=	1.234.000 €
Christian-Ernst-Gymnasium	5.672.000 €		---	=	5.672.000 €
Ohm-Gymnasium, Schulgebäude	6.330.000 €		---	=	6.330.000 €
Ohm-Gymnasium, Turnhalle	1.457.000 €		---	=	1.457.000 €
Fridericianum	1.190.000 €		---	=	1.190.000 €
Albert-Schweitzer-Gymnasium, Schulgebäude	6.807.000 €		---	=	6.807.000 €
Albert-Schweitzer-Gymnasium, Turnhalle	2.082.000 €		---	=	2.082.000 €
Berufsschule, Werkstätten	4.229.000 €		---	=	4.229.000 €
Berufsschule, kaufm. Trakt	3.406.000 €		---	=	3.406.000 €
SFZ II, Schulgebäude	3.537.000 €		---	=	3.537.000 €
SFZ II, Turnhalle	303.000 €	+	925.000 €	=	1.228.000 €
Büchenbach-Dorf, Schulgebäude	1.560.000 €		---	=	1.560.000 €
Büchenbach-Dorf, Turnhalle	---	+	1.075.580 €	=	1.075.580 €
Werner-von-Siemens Realschule, Turnhalle	---	+	1.873.000 €	=	1.873.000 €
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>48.600.000 €</b>	<b>+</b>	<b>6.890.731 €</b>	<b>=</b>	<b>55.490.731 €</b>

Tabelle 1 – Grafik 1:  
Maßnahmen differenziert nach Schulsanierungsprogramm und Konjunkturförderprogramm

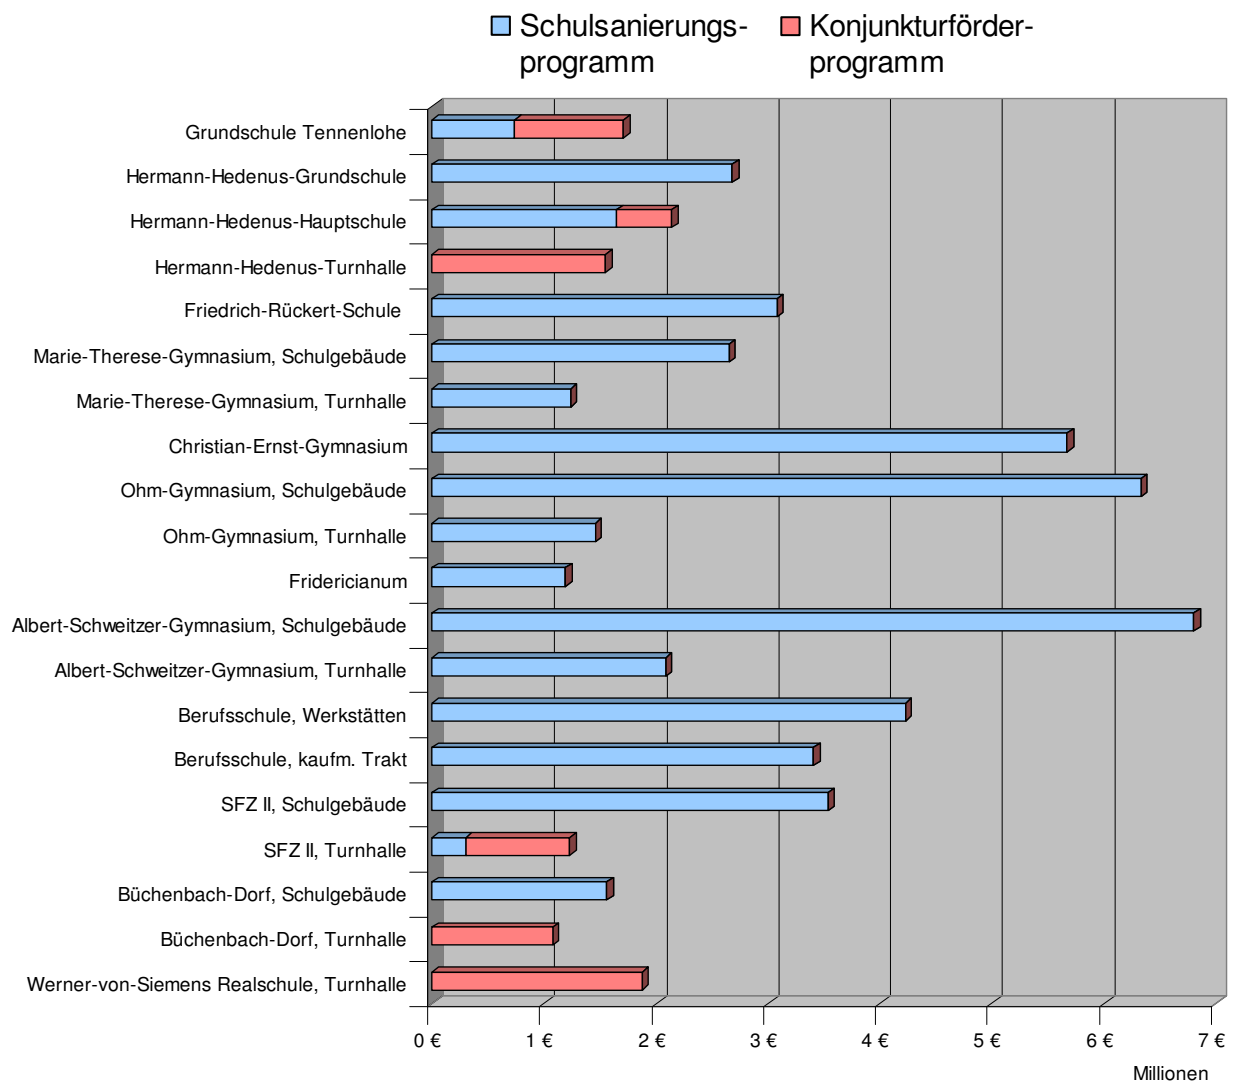


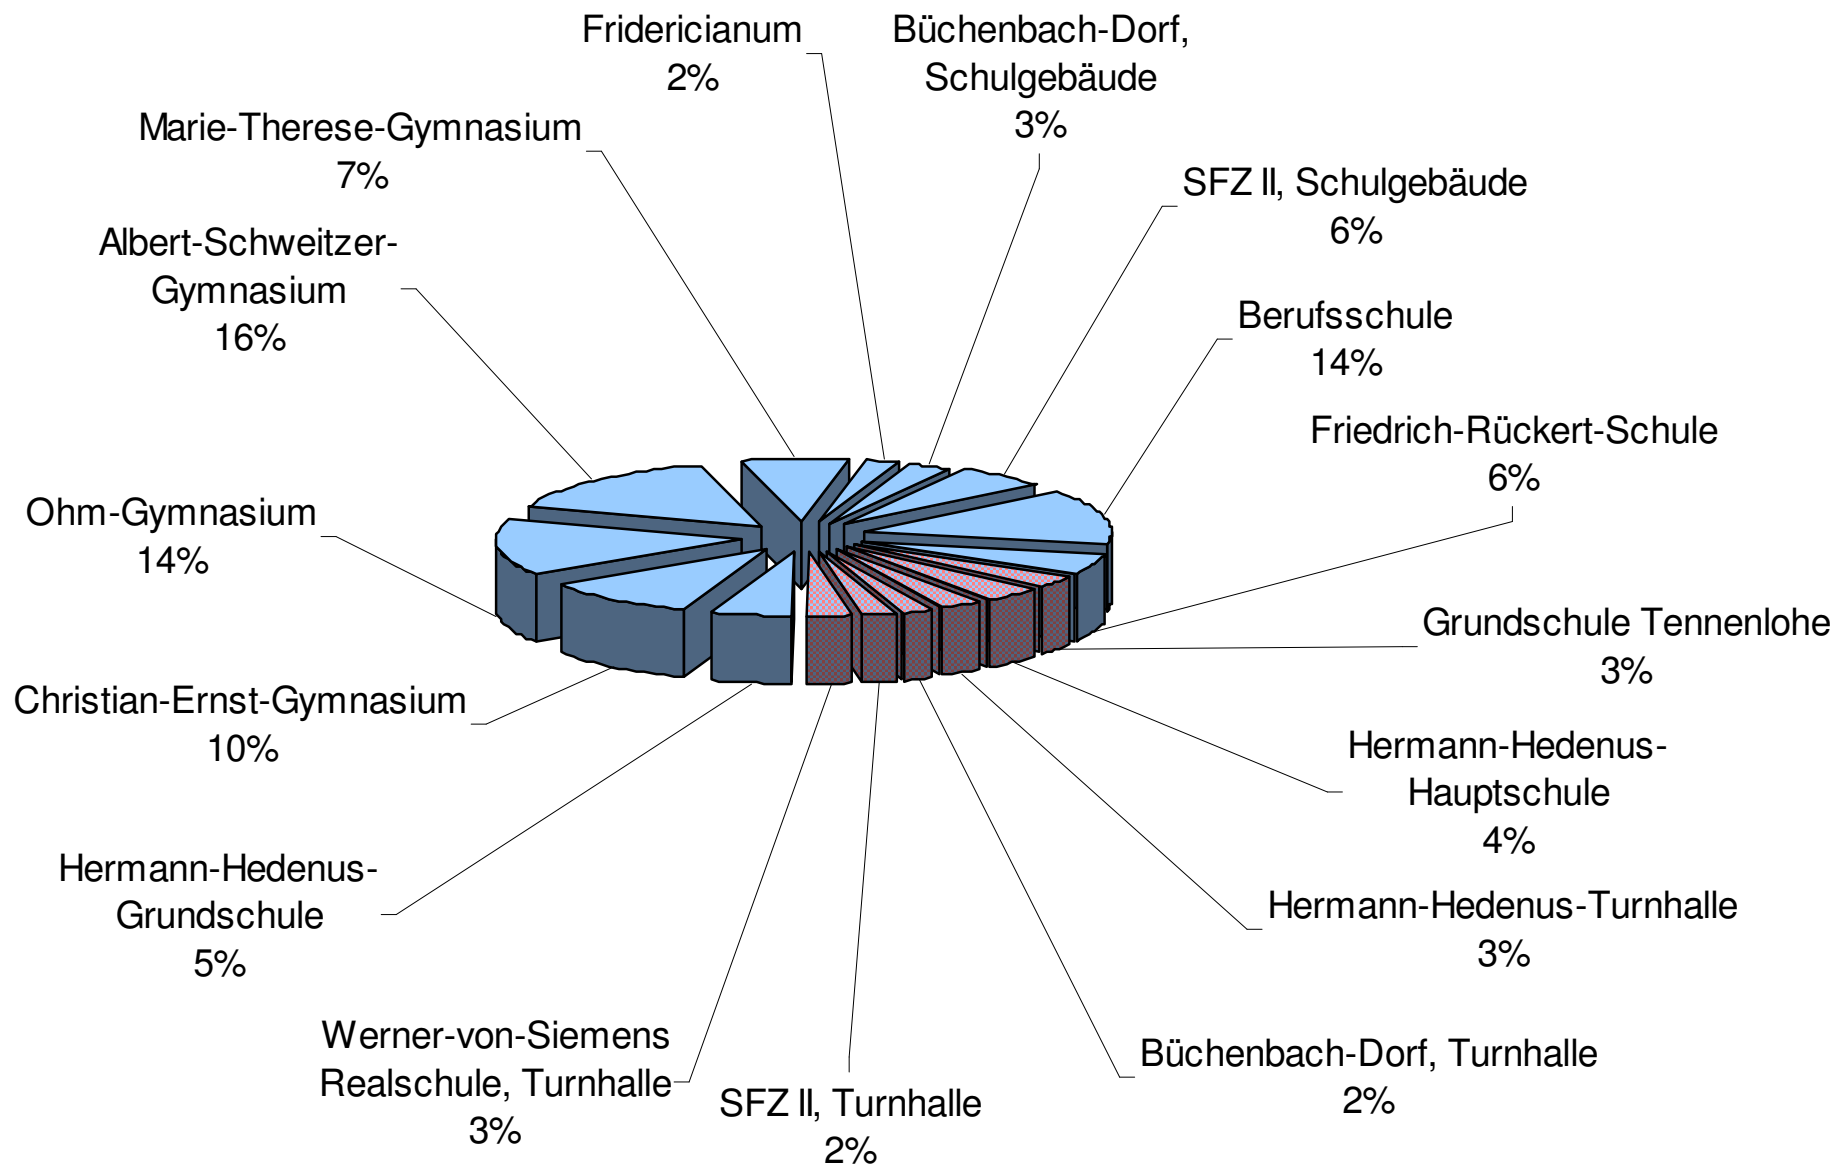

Die Förderung der einzelnen Maßnahmen lässt sich wie folgt darstellen;  
 die Förderhöhen sind zum Teil aus den Förderbescheiden entnommen, zum Teil geschätzt:

	<b>vorbehaltliche Förderung nach FAG</b>		<b>vorbehaltliche Förderung nach Kpl / Invest.pakt 2009</b>		<b>vorbehaltliche Gesamtförderung</b>		<b>Eigenanteil Stadt Erlangen</b>		<b>Gesamtbaukosten</b>
<b>Grundschule Tennenlohe</b>	---	+	1.026.800 €	=	1.026.800 €	+	685.351 €	=	1.712.151 €
<b>Hermann-Hedenus-Grundschule</b>	879.000 €	+	---	=	879.000 €	+	1.800.000 €	=	2.679.000 €
<b>Hermann-Hedenus-Hauptschule</b>	---	+	1.055.600 €	=	1.055.600 €	+	1.083.400 €	=	2.139.000 €
<b>Hermann-Hedenus-Turnhalle</b>	270.000 €	+	624.300 €	=	894.300 €	+	655.700 €	=	1.550.000 €
<b>Friedrich-Rückert-Schule</b>	751.000 €	+	---	=	751.000 €	+	2.328.000 €	=	3.079.000 €
<b>Marie-Therese-Gymnasium, Schulgebäude</b>	---	+	---	=	---	+	2.651.000 €	=	2.651.000 €
<b>Marie-Therese-Gymnasium, Turnhalle</b>	320.000 €	+	---	=	320.000 €	+	914.000 €	=	1.234.000 €
<b>Christian-Ernst-Gymnasium</b>	1.800.000 €	+	---	=	1.800.000 €	+	3.872.000 €	=	5.672.000 €
<b>Ohm-Gymnasium, Schulgebäude</b>	1.900.000 €	+	---	=	1.900.000 €	+	4.430.000 €	=	6.330.000 €
<b>Ohm-Gymnasium, Turnhalle</b>	400.000 €	+	---	=	400.000 €	+	1.057.000 €	=	1.457.000 €
<b>Fridericianum</b>	---	+	---	=	---	+	1.190.000 €	=	1.190.000 €
<b>Albert-Schweitzer-Gymnasium, Schulgebäude</b>	1.800.000 €	+	---	=	1.800.000 €	+	5.007.000 €	=	6.807.000 €
<b>Albert-Schweitzer-Gymnasium, Turnhalle</b>	580.000 €	+	---	=	580.000 €	+	1.502.000 €	=	2.082.000 €
<b>Berufsschule, Werkstätten</b>	1.170.000 €	+	---	=	1.170.000 €	+	3.059.000 €	=	4.229.000 €
<b>Berufsschule, kaufm. Trakt</b>	1.045.000 €	+	---	=	1.045.000 €	+	2.361.000 €	=	3.406.000 €
<b>SFZ II, Schulgebäude</b>	960.000 €	+	---	=	960.000 €	+	2.577.000 €	=	3.537.000 €
<b>SFZ II, Turnhalle</b>	140.000 €	+	397.400 €	=	537.400 €	+	690.600 €	=	1.228.000 €
<b>Büchenbach-Dorf, Schulgebäude</b>	873.000 €	+	---	=	873.000 €	+	687.000 €	=	1.560.000 €
<b>Büchenbach-Dorf, Turnhalle</b>	240.000 €	+	242.900 €	=	482.900 €	+	592.680 €	=	1.075.580 €
<b>Werner-von-Siemens Realschule, Turnhalle</b>	310.000 €	+	821.100 €	=	1.131.100 €	+	741.900 €	=	1.873.000 €
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>13.438.000 €</b>	<b>+</b>	<b>4.168.100 €</b>	<b>=</b>	<b>17.606.100 €</b>	<b>+</b>	<b>37.884.631 €</b>	<b>=</b>	<b>55.490.731 €</b>

Tabelle 2:  
 Darstellung der verschiedenartigen Förderungen sowie des verbleibenden Eigenanteil der Stadt

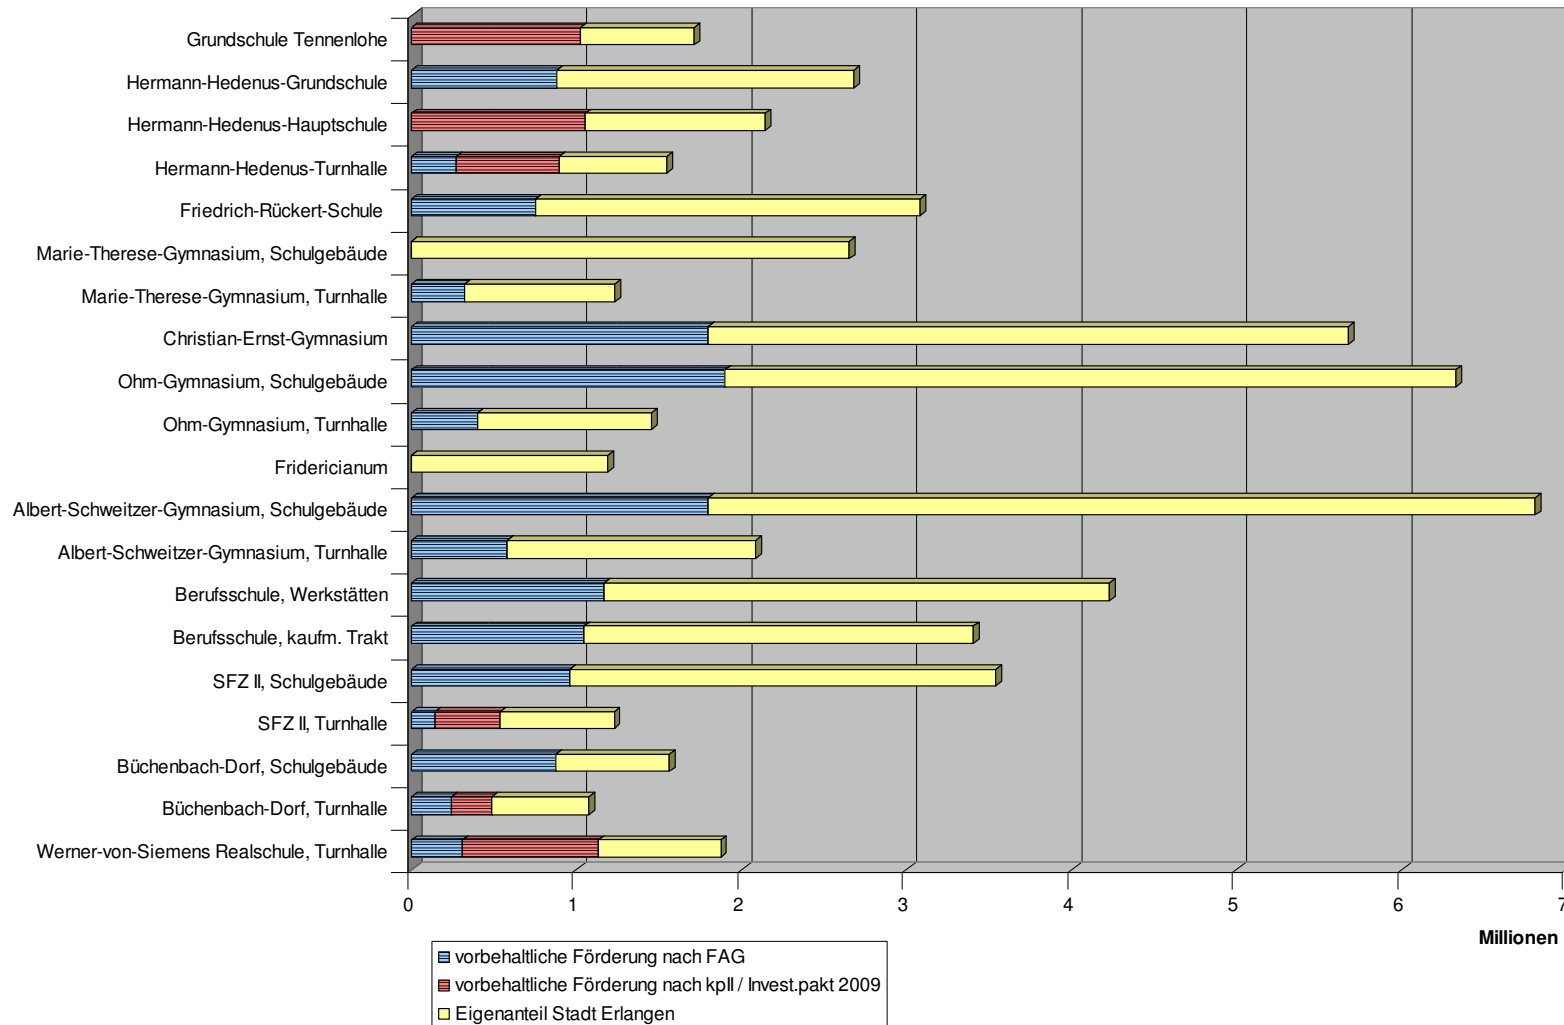

Grafik 2:  
Darstellung der verschiedenartigen Förderungen sowie des verbleibenden Eigenanteil der Stadt

Bei den nachfolgend aufgelisteten Schulen bzw. Turnhallen wurde mit der Planung – bei vielen Maßnahmen bereits mit der Sanierung – begonnen:

- Grundschule Tennenlohe (ohne Turnhallegebäude):** **Konjunkturpaket II**

Sanierungsbeginn	13. Juli 2009
voraussichtliche Fertigstellung	September 2010
Förderung:	nach Konjunkturpaket II mit 977.500,- €
Gesamtbaukosten	1.712.152,- €
Maßnahmen, Hochbau:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dämmung Fassade und Flachdach</li> <li>- Austausch Außenfenster mit Sonnenschutz</li> <li>- Umstrukturierung des Verwaltungstraktes</li> <li>- Neue Fahrradüberdachung und Eingangsvordächer</li> </ul>
Maßnahmen, Brandschutz:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung des ersten Flucht- und Rettungsweges</li> <li>- Errichtung zweier außen liegenden Treppe</li> </ul>
Maßnahmen, Haustechnik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erneuerung der Pumpen und Regeleinrichtungen</li> <li>- Optimierung Heizungsanlage durch hydraul. Abgleich</li> <li>- Sanierung der Abwassergrundleitungen</li> </ul>
  
- Hermann Hedenus Grundschule:**

Sanierungsbeginn	2. Juni 2009
voraussichtliche Fertigstellung	September 2010
Förderung:	nach FAG mit 879.000,- €
Gesamtbaukosten	2.679.000,- €
Maßnahmen, Hochbau:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dämmung der Fassade u. oberste Geschossdecke</li> <li>- Austausch Außenfenster mit Sonnenschutz</li> <li>- Austausch der Dacheindeckung</li> <li>- Sanierung Sanitäranlagen</li> <li>- Maler-, Lackier-, Bodenbelags- u. Fliesenarbeiten</li> </ul>
Maßnahmen, Brandschutz:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung des ersten Flucht- und Rettungsweges</li> <li>- Errichtung einer außen liegenden Treppe</li> <li>- Einbau einer flächendeckenden Brandmeldeanlage</li> </ul>
Maßnahmen, Haustechnik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Instandsetzung Elektroinstall. mit Austausch Beleuchtung</li> <li>- Austausch der Heizungsverteilung und der Heizkörper</li> <li>- Austausch der Sanitärleitungen und -anlagen incl. Sanierung der Grundleitungen</li> </ul>
  
- Hermann Hedenus Hauptschule:** **Investitionspakt 2009**

Sanierungsbeginn	August 2010
voraussichtliche Fertigstellung	November 2011
Förderung:	nach Investitionspakt 2009 mit 1.055.600,- €
Gesamtbaukosten	2.139.000,- €
Maßnahmen, Hochbau:	<p>Dämmmaßnahmen auf EnEV2009-Neubau-Niveau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Austausch der Fenster, Zugangstüren</li> <li>- Aufbau eines Wärmedämmverbundsystems</li> <li>- Erhöhung der Dämmstärke der obersten Geschosßdecke</li> <li>- Erneuerung der bestehenden Welldachdeckung Erneuerung des außen liegenden Sonnenschutzes</li> <li>- Erneuerung der abgehängten Decken in Teilbereichen</li> </ul>
Maßnahmen, Brandschutz:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bodenbelags- und Malerarbeiten in Teilbereichen</li> <li>- Sicherung des ersten Flucht- und Rettungsweges</li> <li>- Einbau einer flächendeckenden Brandmeldeanlage</li> <li>- Ertüchtigung der Elektrounterverteilungen in den notwendigen Fluren</li> </ul>
Maßnahmen, Haustechnik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sanierung Elektroinstall. mit Beleuchtung in Teilen</li> <li>- Austausch der Lüftung, Sanitäranlagen</li> <li>- Sanierung der Grundleitungen</li> <li>- Austausch der Unterverteiler inkl. Regelgruppen</li> </ul>

- **Hermann Hedenus Turnhalle:**

  - Sanierung der Blitzschutzanlage
  - Sanierungsbeginn August 2010
  - voraussichtliche Fertigstellung März 2011
  - Förderung: nach FAG, Förderhöhe noch nicht bekannt, zuzügl. nach Konjunkturpaket II mit 624.300,- €
  - Gesamtbaukosten 1.550.000,- €
  - Maßnahmen, Hochbau:
    - Dämmung der Fassade u. oberste Geschossdecke
    - Austausch Außenfenster mit Sonnenschutz
    - Sanierung Sanitäranlagen und Umkleiden
    - Maler-, Lackier-, Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten
    - Ergänzung der Prallwand in der Turnhalle
  - Maßnahmen, Brandschutz:
    - Sicherung des ersten Flucht- und Rettungsweges
    - Errichtung einer außen liegenden Treppe
    - Einbau einer flächendeckenden Brandmeldeanlage
  - Maßnahmen, Haustechnik:
    - Instandsetzung Elektroinstall. mit Austausch Beleuchtung
    - Austausch der Heizungsverteilung und der Heizkörper
    - Austausch der Sanitärleitungen und -anlagen incl. Sanierung der Grundleitungen
  
- **Friedrich-Rückert Grund- und Hauptschule:**

  - Sanierungsbeginn Mai 2008
  - Fertigstellung erfolgt Einweihung am 24. November 2009
  - Förderung: nach FAG mit 751.000,- €  
Bayrische Landesstiftung mit 54.545,- €
  - Gesamtbaukosten 3.079.000,- €
  - Maßnahmen, Hochbau:
    - Sanierung der Sanitäranlagen, Duschen und Umkleiden
    - Maler-, Lackier-, Bodenbelags- u. Fliesenarbeiten
    - Einbau von abgeh. GK-Lochdecken
    - Aufarbeitung der Holzvertäfelungen und Einbauschränke
    - Rückbau der unter Grundwasserpegel liegenden Gebäudeteile (Heizung) und Abdichtungsmaßnahmen
    - Überholung der bestehenden Fenster und Türen
    - Austausch der Sonnenschutzanlagen
    - Restaurierung. Deckengemälde ehem. Milchtrinkhalle
    - Einbau einer umlaufenden Prallwand in der Turnhalle
  - Maßnahmen, Brandschutz:
    - Sicherung des ersten Flucht- und Rettungsweges
    - Errichtung zweier außen liegender Treppe
    - Ertüchtigung der Deckenkonstruktionen
    - Einbau einer Brandmeldeanlage
  - Maßnahmen, Haustechnik:
    - Sanierung Elektroinstallation und Beleuchtung
    - Erneuerung Heizung, Austausch Sanitärleitungen
    - Einbau einer Lüftungsanlage f. Duschen und Umkleiden
    - Sanierung der Abwassergrundleitg. u. Hofentwässerung
  
- **Christian-Ernst-Gymnasium:**

  - Sanierungsbeginn 2. Juni 2009
  - voraussichtliche Fertigstellung Pfingsten 2010
  - Förderung: nach FAG mit voraussichtlich 1,8 Mio €
  - Gesamtbaukosten 5.672.000,- €
  - Maßnahmen, Hochbau:
    - Sanierung der durchfeuchteten Kelleraußenwände
    - Instandsetzung / Austausch Außenfenster und -türen
    - Sanierung Außenfassade
    - Maler-, Lackier-, Bodenbelags- u. Fliesenarbeiten
    - Dämmmaßnahmen im Dachgeschoss
  - Maßnahmen, Brandschutz:
    - Sicherung des ersten Flucht- und Rettungsweges
    - Errichtung einer außen liegenden Treppe
    - Kompensation durch Brandmeldeanlage und trockene

- Maßnahmen, Haustechnik: Steigleitungen  
 - Sanierung Elektroinstallation  
 - Austausch der Lüftung, Heizung, Sanitär  
 - Sanierung der Abwassergrundleitungen
- **Berufsschule, kaufmännischer Trakt:**

Sanierungsbeginn 2. Juni 2009  
 voraussichtliche Fertigstellung September 2010  
 Förderung: nach FAG mit voraussichtlich 1.045.000,- €  
 Gesamtbaukosten 3.406.000,- €

Maßnahmen, Hochbau:
 
    - Einbau eines behindertengerechten Aufzugs
    - Austausch der Außenfenster mit Sonnenschutz
    - Rückbau der ungedämmten Betonfassadenelemente und Dämmung der Außenfassade und Flachdach
    - Sanierung der Sanitäranlagen
    - Maler-, Lackier-, Bodenbelags- u. Fliesenarbeiten

Maßnahmen, Brandschutz:
 
    - Nachbesserung und Ertüchtigung einzelner Bauteile
    - Einbau einer flächendeckenden Brandmeldeanlage

Maßnahmen, Haustechnik:
 
    - Instandsetzung Elektroinstall. mit Austausch Beleuchtung
    - Sanierung der Fernwärmeübergabestation mit Sanierung der Hauptverteilung
    - Austausch der Sanitärleitungen und -gegenstände
    - Sanierung der Abwassergrundleitungen
  - **Sonderpädagogisches Förderzentrum II, Schulgebäude:**

Sanierungsbeginn 21.07.2008  
 voraussichtliche Fertigstellung Oktober 2011  
 Förderung: nach FAG mit voraussichtlich 960.000,- €  
 Gesamtbaukosten 3.537.000,-€

Maßnahmen, Hochbau:
 
    - Sanierung Außenfassade und anbringen eines WDVS
    - Austausch der Außenfenster, teilw. mit Sonnenschutz
    - Sanierung der Sanitäranlagen
    - Austausch der Innentüren
    - Maler-, Lackier-, Putz und Fliesenarbeiten in Räumen u. Fluren

Maßnahmen, Brandschutz:
 
    - Sicherung des ersten Flucht- und Rettungsweges durch Einbau von Brandschutzdecken und Instandsetzung von Rauchschutztüren
    - Errichtung einer außen liegenden Treppe

Maßnahmen, Haustechnik:
 
    - Sanierung Elektroinstallation
    - Austausch der Lüftungs- und Heizungsanlagen
    - Austausch der Sanitärleitungen und -gegenstände
  - **Sonderpädagogisches Förderzentrum II, Turnhalle:** **Konjunkturpaket II**

Sanierungsbeginn 06.07.2009  
 voraussichtliche Fertigstellung November 2010  
 Förderung: nach FAG mit voraussichtlich 140.000,- €  
 zuzügl. nach KP II mit 397.400,- €  
 Gesamtbaukosten 1.228.000,-€

Maßnahmen, Hochbau:
 
    - Sanierung Außenfassade und anbringen eines WDVS
    - Austausch der Außenfenster, teilw. mit Sonnenschutz
    - Sanierung der Sanitäranlagen
    - Austausch der Innentüren, Anbringen einer Prallwand
    - Maler-, Lackier-, Putz und Fliesenarbeiten

Maßnahmen, Brandschutz:
 
    - Sicherung des ersten Flucht- und Rettungsweges durch Instandsetzung von Fluchttüre,
    - Herstellen einer Versammlungsstätte durch Einbau einer Brandschutzdecke und einer RWA Anlage



- Maßnahmen, Haustechnik:
- Einbau einer neuen Fluchttüre
  - Sanierung Elektroinstallation
  - Austausch der Lüftungs- und Heizungsanlagen
  - Austausch der Sanitärleitungen und -gegenstände
- **Grundschule Büchenbach-Dorf:**
- Sanierungsbeginn 1. August 2007
- voraussichtliche Fertigstellung April 2010
- Förderung: nach FAG mit voraussichtlich 873.000,- €
- Gesamtbaukosten gesamt: 2.690.000,- €, davon im ssp: 1.560.000,- €
- Maßnahmen, Hochbau:
- Dämmung der Fassade u. oberster Geschossdecke
  - Austausch Außenfenster mit Sonnenschutz
  - Erneuerung der Dacheindeckung, Ausbau DG (2.BA)
  - Errichtung neuer Sanitäranlagen
  - Maler-, Lackier-, Bodenbelags-, Innenputz u. Fliesenarb.
  - Sanierung der durchfeuchteten Kelleraußenwände
  - Erneuerung der Innentreppen
  - Errichtung eines neuen Eingansbereiches u. Pausenhalle
  - Umgestaltung des Schulhofes
- Maßnahmen, Brandschutz:
- Sicherung des ersten Flucht- und Rettungsweges
  - Errichtung von 2 außen liegenden Treppe
  - Ertüchtigung der Böden und Decken in F90 bzw. F30
  - Einbau einer Brandmeldeanlage und einer Sicherheitsbeleuchtung
- Maßnahmen, Haustechnik:
- Instandsetzung Elektroinstall. mit Austausch Beleuchtung
  - Austausch der Heizungsverteilung und der Heizkörper
  - Austausch der Sanitärleitungen und -anlagen
  - Sanierung der Grundleitungen im Innen-/ Außenbereich.
  - Einbau einer Lüftungsanlage im Sanitärbereich
- **Büchenbach Dorf Turnhalle:** **Konjunkturpaket II**
- Sanierungsbeginn August 2010
- voraussichtliche Fertigstellung April 2011
- Förderung: nach FAG, Förderhöhe noch nicht bekannt, zuzügl. nach Konjunkturpaket II mit 242.900,- €
- Gesamtbaukosten 1.075.580,- €
- Maßnahmen, Hochbau:
- Dämmung der Fassade
  - Austausch Außenfenster mit Sonnenschutz
  - Erneuerung der Flachdächer sowie des Hallendaches
  - Neuordnung der Sanitäranlagen und Umkleiden durch Errichtung eines Anbaues.
  - Maler-, Lackier-, Bodenbelags-, Innenputz u. Fliesenarb.
  - Einbau einer Prallwand in der Turnhalle
- Maßnahmen, Brandschutz:
- Einbau einer RWA Anlage
  - Errichtung einer außen liegenden Treppe
  - Einbau einer flächendeckenden Brandmeldeanlage
- Maßnahmen, Haustechnik:
- Instandsetzung Elektroinstall. mit Austausch Beleuchtung
  - Austausch der Heizungsverteilung und der Heizkörper
  - Austausch der Sanitärleitungen und -anlagen incl. Sanierung der Grundleitungen
- **Werner-von-Siemens Realschule, Turnhalle:** **Konjunkturpaket II**
- Sanierungsbeginn 17.05.2010
- voraussichtliche Fertigstellung 19.11.2010
- Förderung: nach FAG, Förderhöhe noch nicht bekannt, zuzügl. nach Konjunkturpaket II mit 821.100,- €
- Gesamtbaukosten 1.873.000,- €
- Maßnahmen, Hochbau:
- Dämmung aller Fassaden

- Erneuerung aller Außenfenster mit Sonnenschutzjalousie
  - Erneuerung aller Flachdächer incl. Hallendach
  - Neuordnung der Umkleide-, Wasch- und Duschbereiche.
  - Erneuerung Innenputz und abgehängter Decken
  - Maler-, Lackier-, Putz-, Bodenbelags-, Fliesenarbeiten
  - Einbau von Prallwänden in der Turnhalle
  - Ausstattung Halle zur Nutzung als Versammlungsstätte
  - Sicherheitsbeleuchtung mit Batteriepufferung, Hausalarm
  - Automatischer Rauchabzug über die Fenster
  - Brandlastfreiheit in den Fluchtwegen
  - Instandsetzung Elektroinstall. mit Austausch Beleuchtung
  - Präsenzgesteuerte Hallenbeleuchtung
  - Austausch Luftheizung gegen Deckenstrahlheizung Halle
  - Erneuerung der Heizungsverteilung und der Heizkörper
  - Austausch der Sanitärleitungen und -anlagen
  - Neukonzeption der Dusch- und Waschräume
- Maßnahmen, Brandschutz:
- Maßnahmen, Haustechnik:

Außerhalb des Schulsanierungsprogramms und des Konjunkturförderprogramms wurden und werden vom GME weiterhin im gleichen Zeitraum erhebliche Mittel aus dem Bauunterhaltungsbudget mit ähnlicher Zielsetzung (Sanierung von Schulen) eingesetzt. Dies sind im Einzelnen:

Objekt	Maßnahme	Kosten	Jahr
Max- und Justine- Elsner- Schule	Generalsanierung	1.760.000 €	2008-2009
Schule Büchenbach- Nord	Einbau Schulküche und PCB- Fachraum	491.000 €	2009
Schule Büchenbach- Nord	Neubau Aufenthaltsraum	Spende Rotarier	2009
Werner- von Siemens- Realschule, Klassentrakt	Erneuerung Fenster und Sonnenschutz	330.000 €	2009
Grundschule Brucker Lache	Einbau Deckenstrahlheizung	90.000 €	2009
Friedrich- Sponsel- Sporthalle	Sanierung Dusch- und Toilettenanlagen	800.000 €	2009
Ernst- Penzoldt- Schule	Flachdachsanierung	180.000 €	2009
Realschule am Europakanal	Sanierung Physiksaal	60.000 €	2008
Marie- Therese- Gymnasium, Verwaltung, Lehrerzimmer	Umbau- und Sanierungsmaßnahmen	50.000 €	2008
Grundschule Frauenaurach	Sanierung Toilettenanlage	200.000 €	2008
Ernst- Penzoldt- Schule	Einbau zusätzliche Schulküche	85.000 €	2008
Fachoberschule	Erneuerung Treppenhausfassade	200.000 €	2008
Grundschule Dechsendorf, Turnhalle	Einbau neuer Fenster und Deckenstrahlheizung	100.000 €	2008
Ernst- Penzoldt- Schule	Sanierung Schulküche	85.000 €	2007
Sporthalle am Europakanal	Sanierung Toilettenanlagen	80.000 €	2007
Georg- Simon- Ohmgymnasium	Umbau und Sanierung Lehrerzimmer	100.000 €	2007
Gymnasium Fridericianum	Generalsanierung Sporthallen	1.200.000 €	2007
Fachoberschule	Sanierung des Kellergeschoßes	70.000 €	2007
Verschiedene Schulen, Elsnervermächtnis	Sanierungen	1.500.000 €	2007-2008
Fast alle Schulen	Brandschutzmaßnahmen	1.500.000 €	2007-2009
Eichendorffschule	Sanierung Dusch- und Umkleidebereich	242-2	2007-2010
	<b>gesamt:</b>	<b>8.881.000 €</b>	


### 3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

4. **Ressourcen**

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Aus der folgenden Grafik ist der Mittelabfluss für das Schulsanierungsprogramm und das Konjunkturförderprogramm, Zeitraum 2006 bis 2010 zu entnehmen:

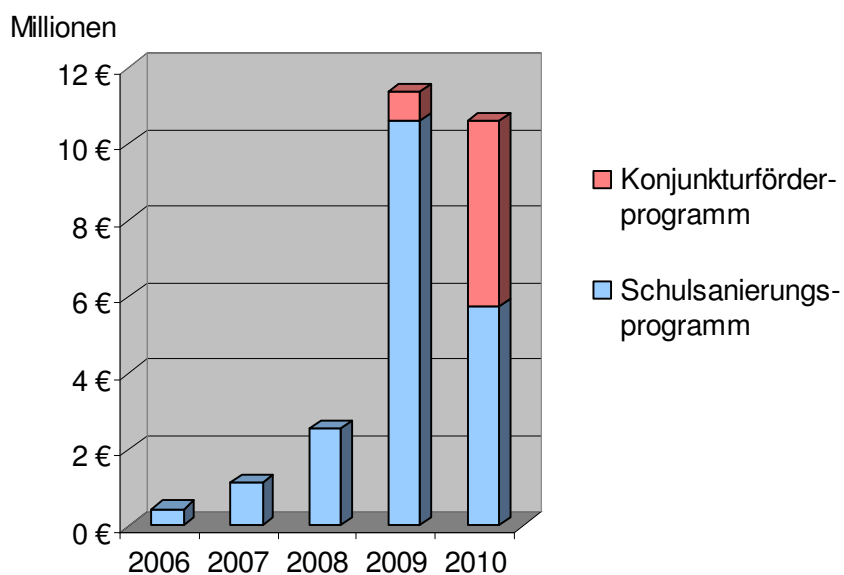

Grafik 3: Abfluss Haushaltsmittel

III. **Abstimmung**

Beschluss des Stadtrates

mit 48 gegen 0 Stimmen

gez. Dr. Balleis

.....  
Vorsitzende/r des

gez. Bruse

.....  
Berichterstatter/in

IV. **Beschlusskontrolle**

Datum	Gremium	Umsetzung
-------	---------	-----------

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Kopie an <Amt 242-3> zum Vorgang
