

**VDE 8.1.1 ABS Nürnberg – Ebensfeld
S-Bahn Nürnberg
2. Baustufe – Bamberg – Nürnberg – Hartmannshof
1. Bauabschnitt Bamberg Nürnberg Hbf**

**Sitzung 18.10.2011
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuß /Werkausschuß EB77 der Stadt Erlangen**

DB ProjektBau GmbH

Regionalbereich Südost, Großprojekt VDE 8


I.BV-SO-G (5)

Nürnberg, 18.10.2011

Vortrag zu Baumaßnahmen Bereich Erlangen

- **Übersicht Projekt**
- **Erreichte Baumaßnahmen**
- **Ausblick auf bevorstehende Maßnahmen Bereich Erlangen in 2012**
- **Baumaßnahmen nach 2016 Abschnitt Erlangen Bf – Baiersdorf**
- **Öffentlichkeitsarbeit**

Übersicht Verkehrsprojekt VDE 8.1.1 und S-Bahn (Auszug)

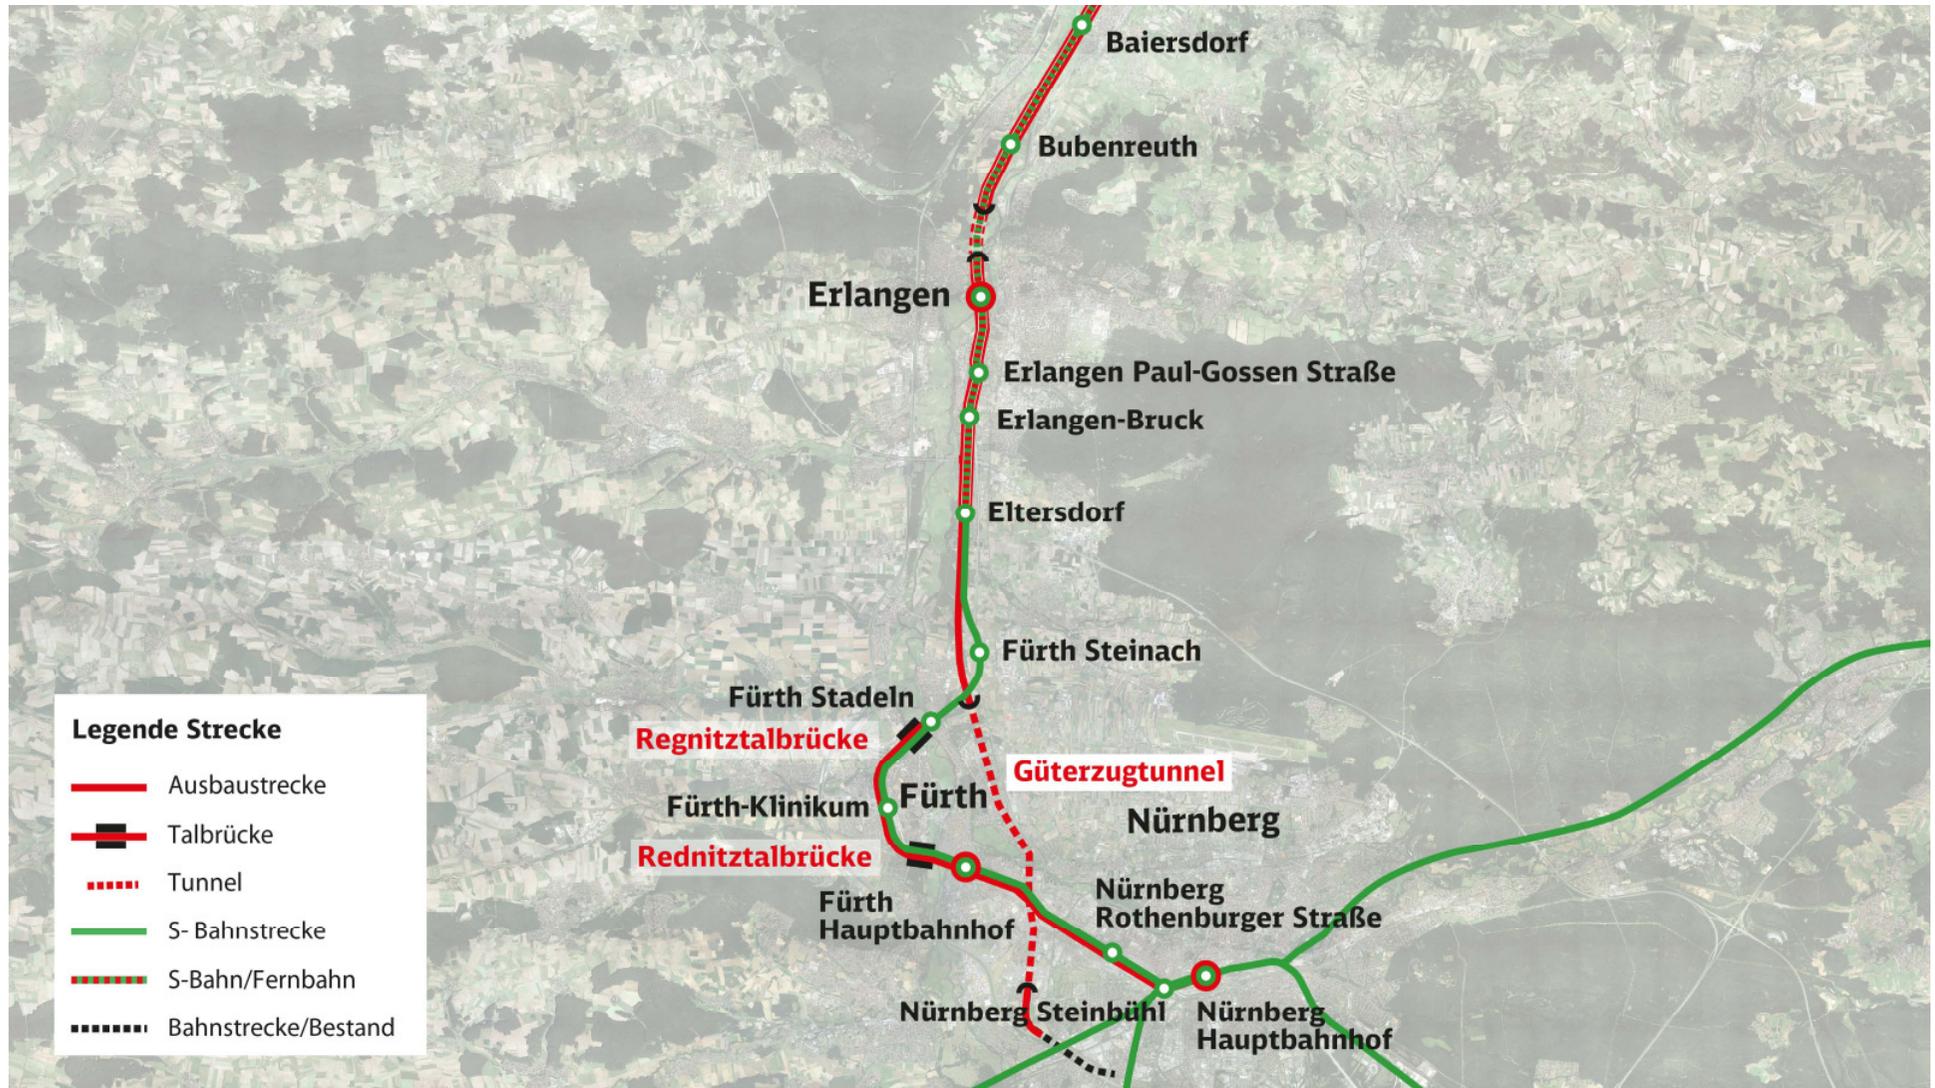

Vortrag zu Baumaßnahmen Bereich Erlangen

Stand 10/2011

Planfeststellungsbeschuß vom 30.10.2009 (PFA 17)

Klagen sind abgewiesen / zurückgezogen ⇒ Umsetzung kann erfolgen

Bereits umgesetzt

Vorauslaufend: Erneuerung Bahnsteige der Stationen Eltersdorf und Bruck für S-Bahn-Verkehr

Bahnsteige stellen einen Zwischenzustand dar für den jetzt herzustellenden Endzustand

Erreichte Baumaßnahmen

- Bahnsteigerneuerung Eltersdorf und Bruck für S-Bahn Betrieb

Metallkonstruktion

Wetterschutzanlage
in Betrieb seit 12/10



Erlangen Bruck

Vortrag zu Baumaßnahmen Bereich Erlangen

Erreichte Baumaßnahmen

Im Baufeld zwischen Eltersdorf und Erlangen Bf sind vorauslaufende Maßnahmen bereits umgesetzt bzw. im Gang

- Erneuerung der SÜ Felix-Klein-Straße (Stadt Erlangen)
- Provisorium Bahnsteig Erlangen Gleis 2/3
- Kabeltrassenverlegung
- Weicheneinbau in Eltersdorf
- Signalbauarbeiten (Signalbrücken)
- Anpassung der Oberleitung
- Leitungsverlegungen Dritter

Vortrag zu Baumaßnahmen Bereich Erlangen

Erreichte Baumaßnahmen

- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme Biotoppflege durch Herstellung einer Pferdekoppel im NSG Tennenloher Forst

Planrechtliche Forderung
Erweiterung des Geheges:
Maßnahme ist abgeschlossen

Zaunlänge: 3,6 km

Kosten: 250 T€



Vortrag zu Baumaßnahmen Bereich Erlangen

Ausblick auf bevorstehende Baumaßnahmen

- Streckenbaumaßnahme Paul-Gossen-Str. - Erlangen ab 11/2011
- Erneuerung Mittelbahnsteig Bf Erlangen (Aufzug, Treppe, Dach) ab 01/2012
- Vorgezogene zu errichtende Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen (Bereich Eltersdorf und Hutgraben) ab 02/2012
- Erstellung Fuß- und Radwegunterführung Bruck (Bahnsteigzugang) ab 08/2012
- Streckenausbau Eltersdorf - Paul-Gossen-Str. (verschiedene Einzelvergaben) ab IV. Quartal 2012
vorgesehen
vorgezogene Einzelmaßnahmen ggfs. früher
(Stützbauwerke)

Vortrag zu Baumaßnahmen Bereich Erlangen

Ausblick auf bevorstehende Baumaßnahmen

- Streckenbaumaßnahme Paul-Gossen-Str. - Erlangen

Lagepläne aus PF-Beschluß 8-11 (Anlage 4)



Vortrag zu Baumaßnahmen Bereich Erlangen

Streckenbaumaßnahme Paul-Gossen-Str. – Erlangen

Schwerpunkt Erneuerung Bahnsteig Gleis 2/3 in Bf Erlangen

- Herstellung Zufahrt von Friedrich-List-Straße (noch in 2011)
- Erneuerung Zugangsanlage
- Einbau Aufzug
- Neubau Bahnsteigdach
- Maßnahme wird unter Aufrechterhaltung Betrieb durchgeführt (Lenkung der Reisenden)



Fertigstellung Bahnsteig: Dez. 2013

Vortrag zu Baumaßnahmen Bereich Erlangen

Streckenbaumaßnahme Paul-Gossen-Str. – Erlangen

Schwerpunkt Erneuerung der Straßenbrücke (Brückenüberbaufläche 47x35 m)



- Abgestimmter Realisierungsablauf mit Stadt Erlangen
 - bis 06.11.2011 vorauslaufende Spartenverlegungen (ESTW/DTk)
Vorankündigung Baumaßnahmen (Straßenbereich)
 - 10.11.2011 Beginn Vorarbeiten (Herstellung neue Verkehrsführung)
 - 19.-21.11.2011 Sperrung nördliche Fahrbahn

Grundsatz: immer 2 Fahrstreifen offen

Fertigstellung Brücke: 12/2015

Fertigstellung Bahnsteig: 06/2015

Vortrag zu Baumaßnahmen Bereich Erlangen

Vorgezogene A/E-Maßnahmen Bereich Eltesdorf und Hutgraben

Ziel: Einhaltung der naturschutzfachliche Auflagen aus PF-Beschluß

- Aufforstung
- Herstellen Sukzessionsflächen
- Grünlandextensivierung

Maßnahmen ist Voraussetzung für Streckenausbaumaßnahme südlich Autobahn A3 Beginn ab 02/2012 vorgesehen

Sicherung Grunderwerb (Dienstbarkeiten)

Vortrag zu Baumaßnahmen Bereich Erlangen

Fuß- und Radwegunterführung Bruck (Teilleistung Bahnbereich)



- stadtteilverbindende Unterführung (lichte Weite 6,0m x lichte Höhe 3,0)
- Bahnsteigzugang
- Aufzug
- Rampenanlagen (Stadt Erlangen)

Fertigstellung: IV. Quartal 2013

Vortrag zu Baumaßnahmen Bereich Erlangen

Streckenausbau Knoten Eltersdorf – Paul-Gossen-Straße (4-gleisig)

Haltepunkt Eltersdorf (Blick
von Nordost)



EBR Kreisstraße ER5 mit Überwerfung



- Verschiedene Vergabeeinheiten vorgesehen

vorgezogen: Herstellung Stützbauwerke und Lärmschutzanlagen östlich der bestehenden Strecke
südliches Bauende: nördlich der Straße ER 5. Weiterbau in Südlicher Richtung ohne bahnbetriebliche Einschränkungen möglich

Beginn ab IV. Quartal 2012

Fertigstellung: vsl. 12/2016

Vortrag zu Baumaßnahmen Bereich Erlangen

Ausblick weitere Maßnahmen

- Einbindung Güterzugstrecke und S-Bahn in den Knoten Eltersdorf bis 2016 vorgesehen
- Ausbaumaßnahmen nördlich Bf Erlangen
Baubeginn in 2015 vorgesehen

Vortrag zu Baumaßnahmen Bereich Erlangen

Baubegleitendes Informationskonzept

- Eröffnung eines Informationszentrums in Erlangen / Güterhallenstraße

regelmäßige Information
von Bauhöhepunkten

Kooperation mit Medien

Materialien, Infobroschüren

Eröffnung für 01. Quartal
2012 geplant



Vortrag zu Baumaßnahmen Bereich Erlangen

Baubegleitendes Informationskonzept

Bürgerinformation / Presseinformation

- Gesonderte Öffentlichkeitsveranstaltung (DB AG)
- Pressegespräch zur Eröffnung und zum Erklären der Baumaßnahmen
- Presseinformation zum Baubeginn mit Versand an Anlieger
- Internet: www.vde8.de
Verlinkung auf Internetauftritt der Stadt Erlangen
- Anzeigen / Plakatierung „Max Maufwurf“
- Fahrplanänderungen auf bekannten Medien

Vortrag zu Baumaßnahmen Bereich Erlangen

Auswirkungen auf öffentlichen Verkehrsraum, Baulärm und -schmutz

- Baustellenerschließung / Baustelleneinrichtungskonzept ist planfestgestellt
Transport i. W. auf öffentlichen Straßen
- Baustellenlogistikfläche:
 - Güterbahnhofstraße
 - Güterbahnhof
 - Fläche Fa. Kempe (Karl-Zucker-Straße)
- Baustelleneinrichtungsflächen
 - Bereich Paul-Gossen-Straße
 - Bereich bei Brucker Bf



Vortrag zu Baumaßnahmen Bereich Erlangen

Lärmschutzwände

- Lärmschutzwand Eltersdorf ab 2013 geplant

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
