

Baumpflanzung	Maßnahme	5.E5 ba 1
Art	Qualität	Anzahl
Alnus glut. (Al.gl.)	Stbu. 3xv. 14-16 m.B.	9
Summe aller Pflanzen		9
"Fläche mähen, Mahdgut abfahren, Abfall einbringen. Pflanzgrube 80 x 80 x 60 cm herstellen. Bodenverbesserung und Dünger einbringen. Pflanzen einschlämmen. Pflanzenverankerung mit Dreieck mit Bindegurt. Gießring D = 100 cm und Verblisschutz herstellen. Baumscheibe D = 1,5 m"		

Gehölzpflanzung	Maßnahme	5.E5 bs 1
Baum und Strauch	Fläche	415 m²
Art	Qualität	Anzahl
Acer campestre	L.Hei.100 - 125	10
Alnus glutinosa	L.Hei.100 - 125	15
Carpinus betulus.	L.Hei.100 - 125	10
Prunus avium	L.Hei.100 - 125	5
Salix alba	L.Hei.100 - 125	10
Salix caprea	L.Hei.100 - 125	15
Cornus sang.	I.Str., 70-90	30
Corylus ave.	I.Str., 70-90	30
Lonicra xylosteum	I.Str., 70-90	20
Salix aurita	I.Str., 70-90	45
Salix viminalis	I.Str., 70-90	45
Sambucus nigra	I.Str., 70-90	30
Viburnum lantana	I.Str., 70-90	15
Summe aller Pflanzen		280

Geholzpflanzung	Maßnahme	5.E5 bs 2
Baum und Strauch	Fläche	3316 m²
Art	Qualität	Anzahl
Acer campestre	L.Hei.100 - 125	50
Alnus glutinosa	L.Hei.100 - 125	100
Carpinus betulus.	L.Hei.100 - 125	50
Fraxinus excelsior	L.Hei.100 - 125	80
Prunus avium	L.Hei.100 - 125	10
Salix alba	L.Hei.100 - 125	100
Salix caprea	L.Hei.100 - 125	100
Cornus sang.	I.Str., 70-90	300
Corylus ave.	I.Str., 70-90	250
Crataegus mon.	I.Str., 70-90	100
Euonymus europaeus	I.Str., 70-90	100
Lonicera xylosteum	I.Str., 70-90	150
Salix aurita	I.Str., 70-90	200
Salix viminalis	I.Str., 70-90	200

Ansaat	Maßnahme	5.E5 Hgraben 1
Saatgut Gewässer	Fläche	600 m²

Rückbau von Uferbefestigungen und Abflachen von Gewässerböschungen sind Inhalte der Maßnahme "Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz Htgraben". Dazu sind Bodenarbeiten zur Profilierung und die landschaftsgerechten Gestaltung des Htgrabens auf einer Länge von 269 m auszuführen.

Vorhanden sind innerhalb der verfügbaren Flächen einbauen. Vorhandene Gehölze am Gewässerrand sind soweit möglich zu integrieren.

Nach Profilierung Boden lockern.

Ansaat herstellen mit 3g/m2 Saatgut Gewässer, anschließend abwalzen.

Ansatz	Maßnahme	5.E5 Hgraben 2
Saatgut Gewässer	Fläche	900 m²

Rückbau von Uferbefestigungen und Abflachen von Gewässerböschungen sind Inhalte der Maßnahme "Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz Hutgraben". Dazu sind Bodenarbeiten zur Profilierung und die landschaftsgerechten Gestaltung des Hutgrabens auf einer Länge von 186 m auszuführen.

Boden lösen und innerhalb der verfügbaren Flächen einbauen. Vorhandene Gehölze am Gewässerrand sind soweit möglich zu integrieren.


Nach Profilierung Boden lockern.

Ansatz herstellen mit 3g/m² Saatgut Gewässer, anschließend abwalzen.

Baumpflanzung	Maßnahme	5.ES bis 2
Art	Qualität	Anzahl
Quercus robur	H 3xv. 14-16 m.B.	5
Summe aller Pflanzen		5
"Fläche mähen, Mahdgut abfahren, Abfall absammeln. Pflanzgrube 80 x 80 x 60 cm herstellen Bodenverbesserung und Dünger einbringen Pflanzen einschlämmen. Pflanzenverankerung mit Dreibeck mit Bindegurt. Gießring D = 100 cm und Verbißschutz herstellen. Baumscheibe D = 1,5 m"		

Fläche mähen, Mahdgut abfahren, Abfall absammeln Boden lockern.
Sträucher in Gruppen von 3 bis 5 Stück je Art pflanzen.
Heister einzeln, mittig in Fläche pflanzen.
Pflanzenabstand 1,2 x 1,2 m. Bodenverbesserung und Dünger einbringen. Pflanzen einschlämmen. Fläche 10 cm dick mulchen.
Fläche einzäunen.


Viburnum opulus	I.Str., 70-90	150
Summe aller Pflanzen		2200
Fläche mähen, Mahdgut abfahren, Abfall absammeln Boden lockern. Sträucher in Gruppen von 3 bis 5 Stück je Art pflanzen. Heister einzeln, mittig in Fläche pflanzen. Pflanzenabstand 1,2 x 1,2 m. Bodenverbesserung und Dünger einbringen. Pflanzen einschlämmen. Fläche 10 cm dick mulchen. Fläche einzäunen.		

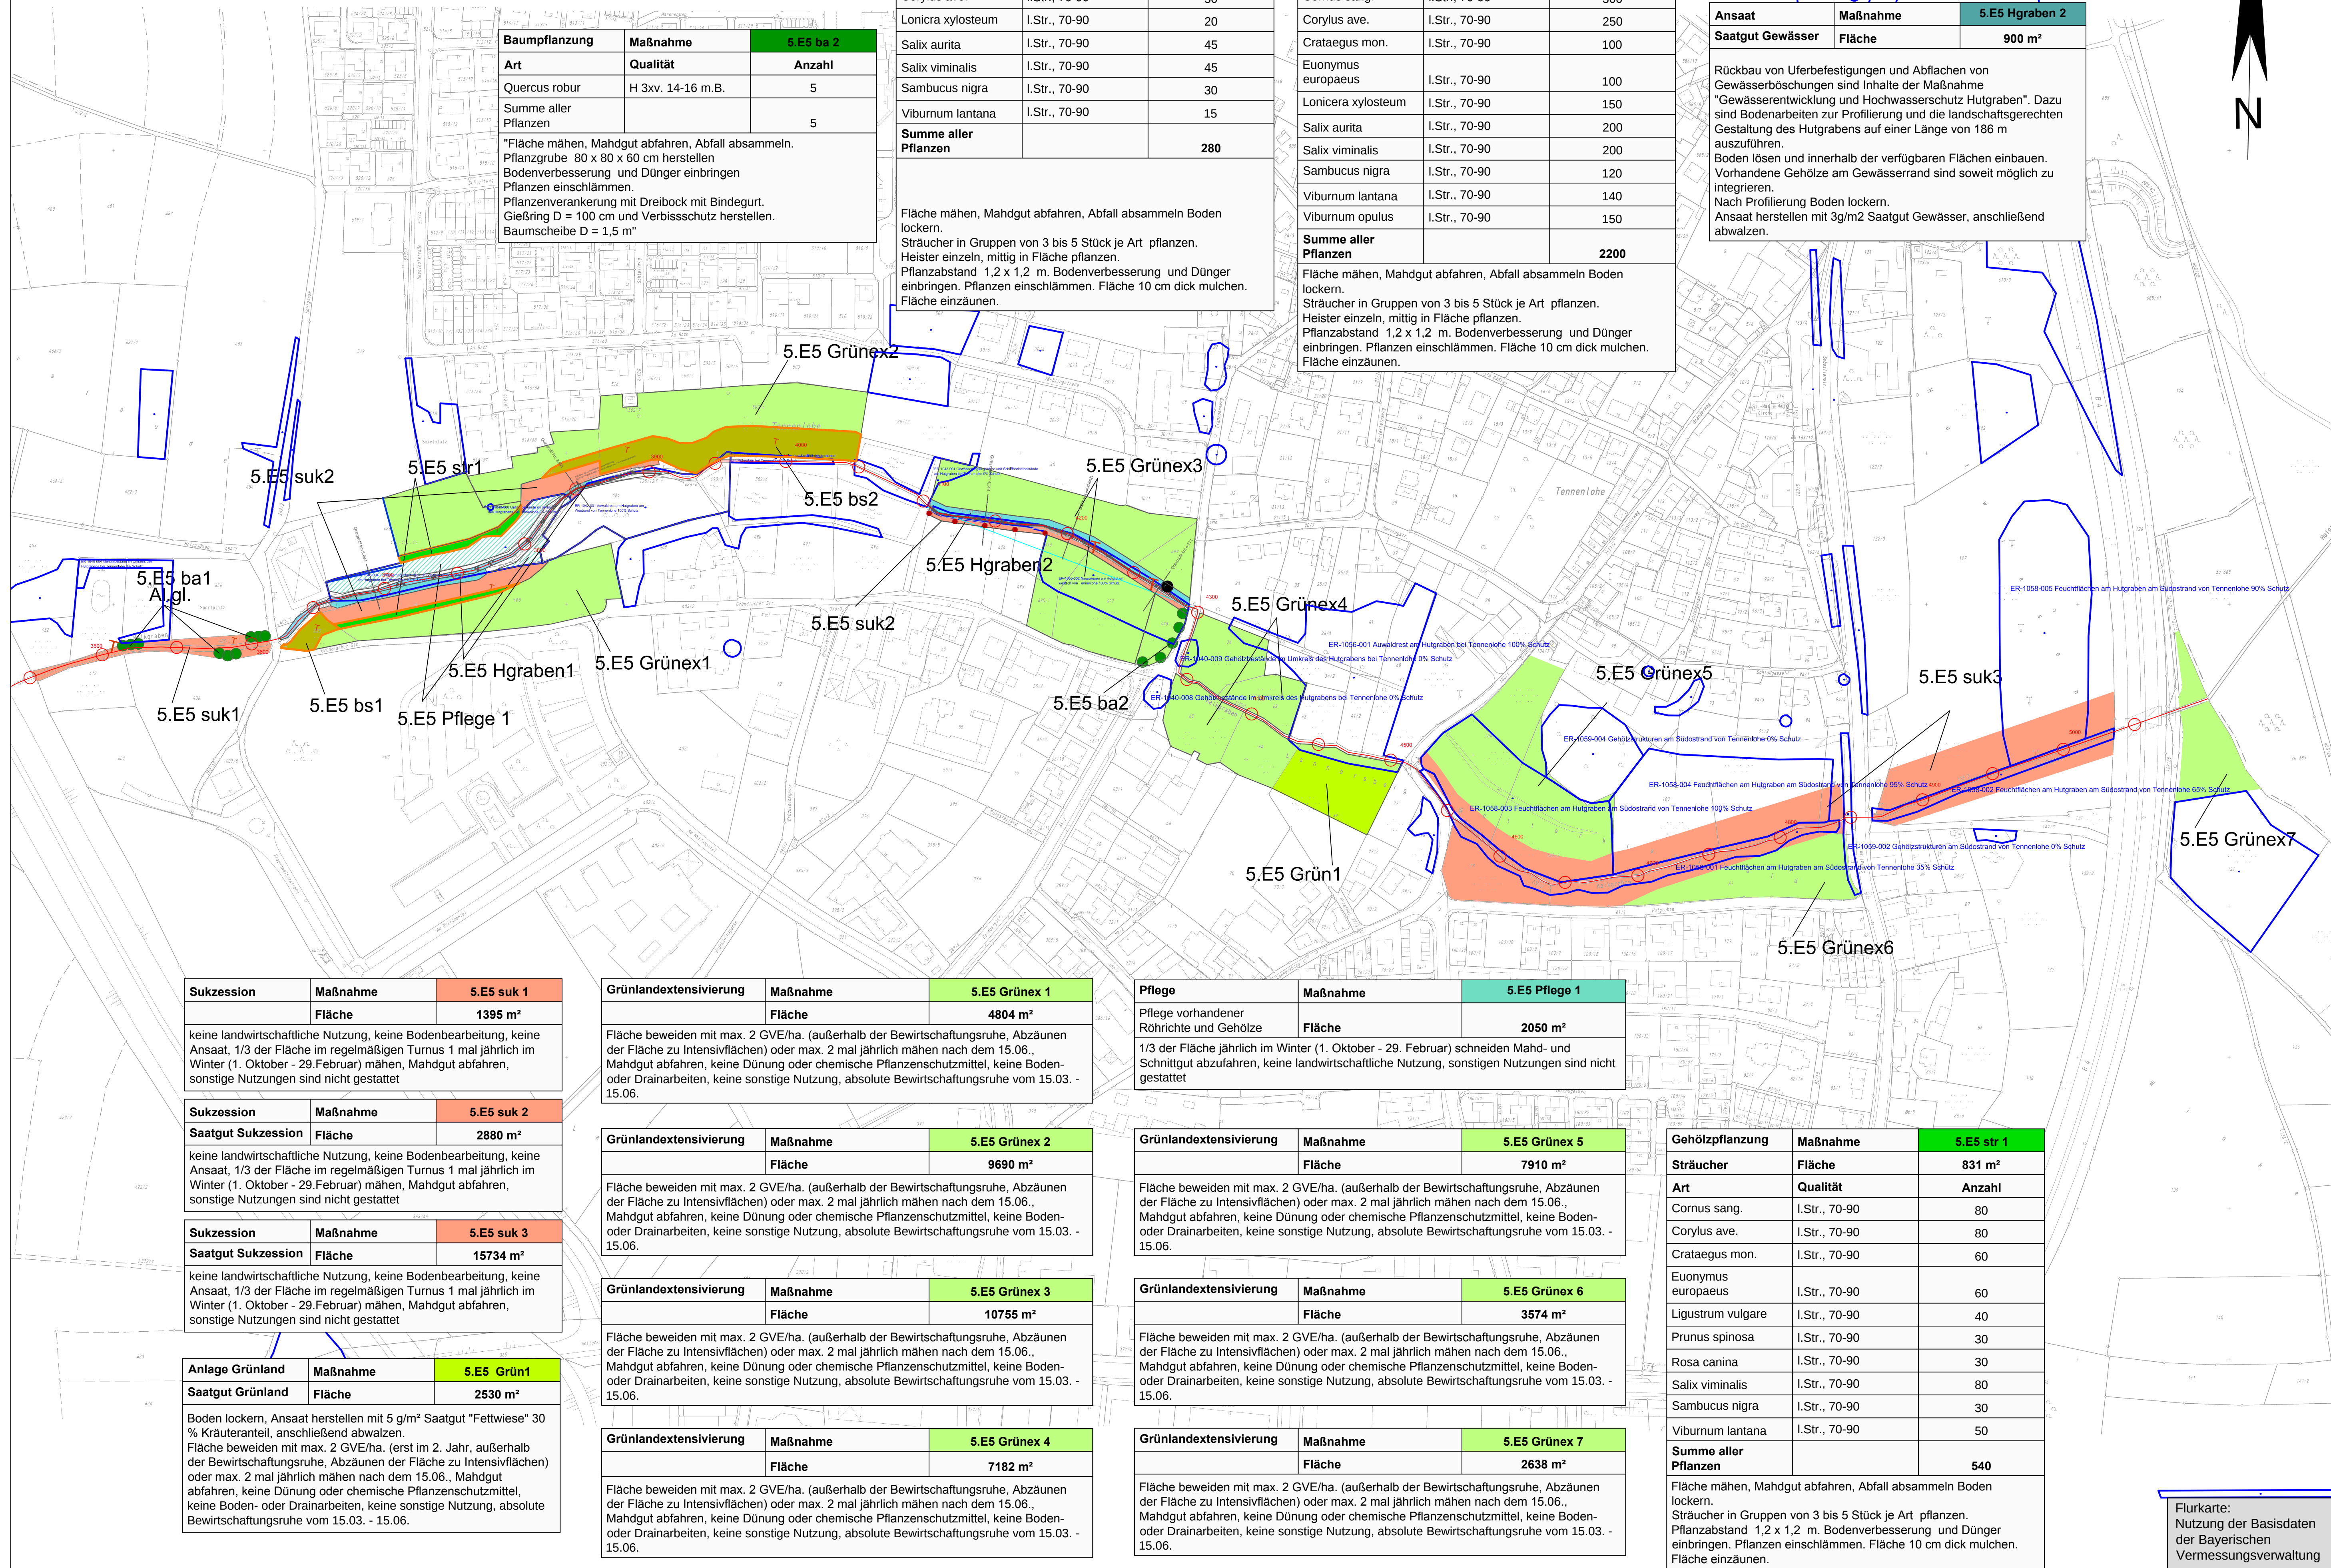


Flurkarte:
Nutzung der Basisdaten
der Bayerischen
Vermessungsverwaltung

Legende:

Bestand

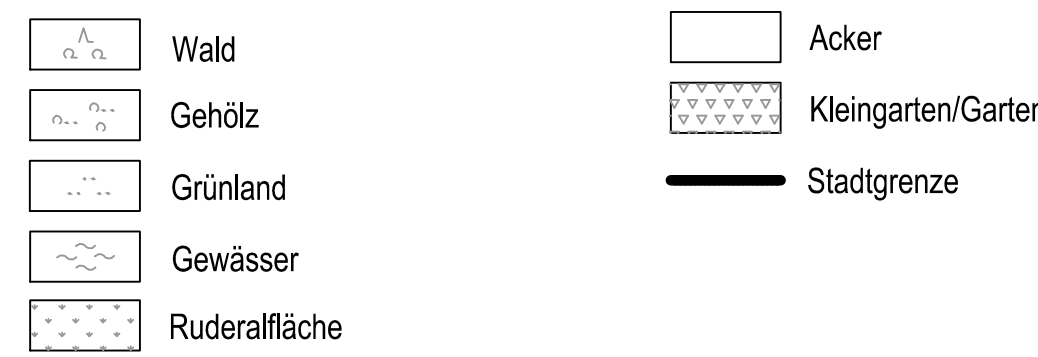

Planung

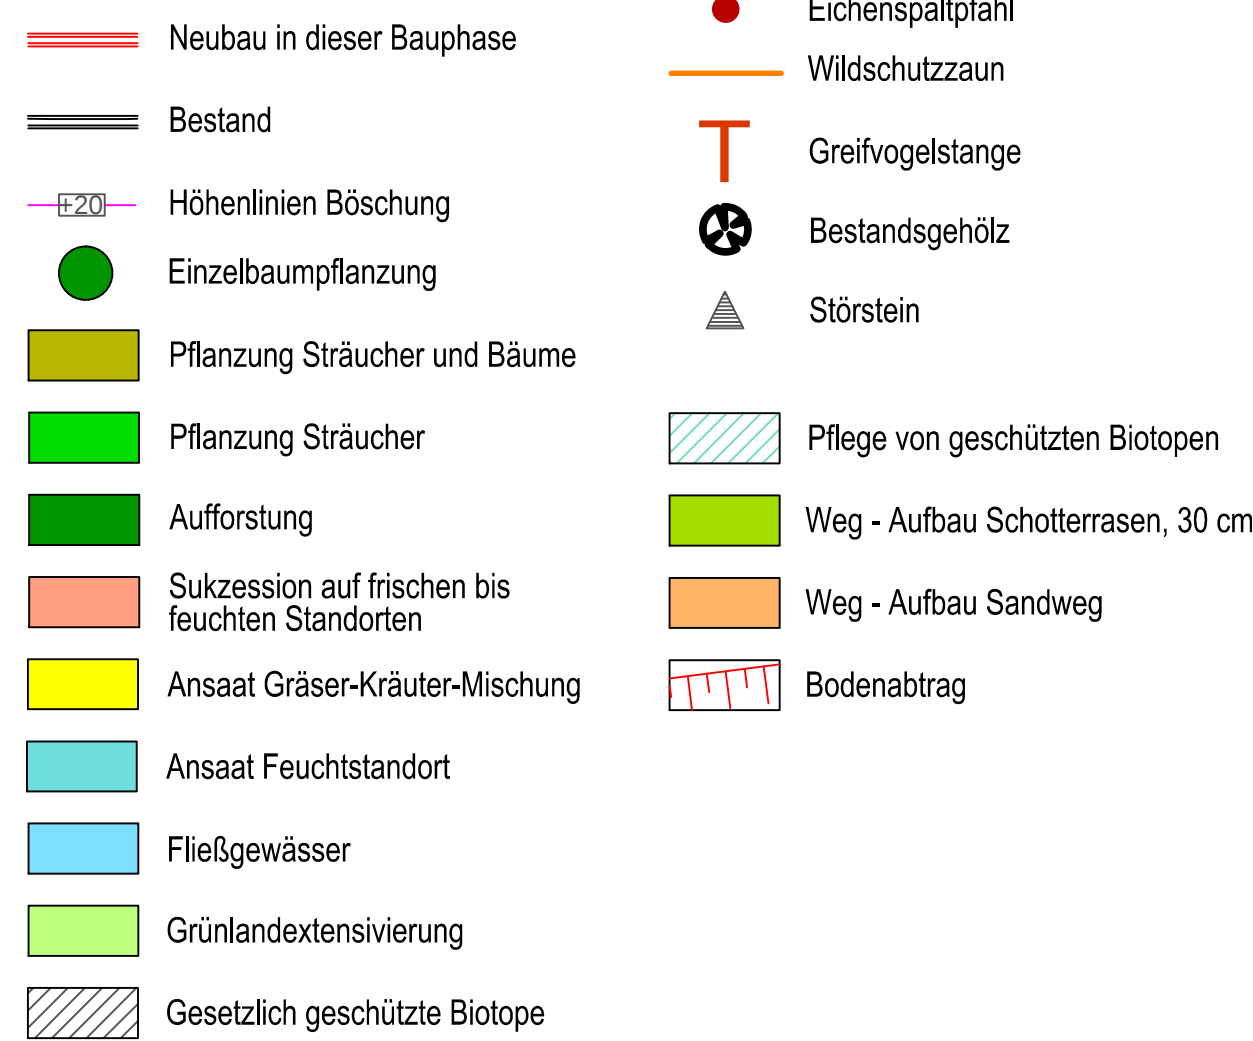

Die Inhalte der Bauphase des Vergabepaketes 144 sind farbig dargestellt;
 * Diese Maßnahmen sind im Leistungsverzeichnis Bestandteil des Titels "Baustelleneinrichtung";
 + Diese Maßnahmen sind im Leistungsverzeichnis Bestandteil des Titels "Herstellen Entwässerung".
 Maßnahmen in Schwarz oder Grautönen sind Bestandteil vorlaufender Vergabepakete oder Bauphasen

index:		Änderungen bzw. Ergänzungen		Name:		Datum:									
Prüfermerke															
die Übereinstimmung der Zeichnung mit der Ausführung bestätigt:				gleichgestellt mit Prüfexemplaren		geprüft / genehmigt									
für den Auftragnehmer: Ort, Datum, Unterschrift				Datum 25.08.2014 Steffen Mauer Prüfingenieur											
für die DB ProjektBau Ort, Datum, Unterschrift															
Interoperabilität geprüft (benannte Stelle) Name															
Datum															
geprüft / genehmigt															
Datum															
geprüft / genehmigt															
Datum 01.08.2014 Toralf Bohn [A]															
geprüft / genehmigt															
Datum															
geprüft / genehmigt															
Ort, Datum, Unterschrift (BVB)															
Logeskinze															
zur bautechnischen Prüfung freigegeben				Genehmigung zur Bauausführung											
Ort, Datum, Unterschrift (BVB)				Ort, Datum, Unterschrift											
Auftragnehmer:				Planverfasser:											
 LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG BAUUNTERNEHMUNG Leonhard-Weiss-Str. 2-3 74589 Satteldorf Tel.: 07951-33-0				 Planungsbüro Lauchhof A. Kuchner-Prak-77 30159 Hannover Tel.: 0511/89-4801 fax: 0511/89-48-607 info@planungsbuero-lauchhof.de <i>Pollok</i> Hannover, 10.-06.-2014, gez. S. Pollok											
Satteldorf, 01.08.2014, gez. Toralf Bohn (Köder)				Ort, Datum, Unterschrift											
Bauherr:				Planung:											
 DB NETZE DB Netz AG INPC ZIC Elisabeth-Schwarzhaupt Platz 1 10115 Berlin				 DB NETZE DB ProjektBau GmbH Regionalbereich Südost Äußere Cramer-Klett Straße 3 90489 Nürnberg											
Maßstab:				Auftrag-Nr.:											
1:2500				<table><tr><th>Datum</th><th>Name</th></tr><tr><td>gez. 06/2014</td><td>NT</td></tr><tr><td>bearb. 06/2014</td><td>WH</td></tr><tr><td>gez. 06/2014</td><td>Pollok</td></tr></table>				Datum	Name	gez. 06/2014	NT	bearb. 06/2014	WH	gez. 06/2014	Pollok
Datum	Name														
gez. 06/2014	NT														
bearb. 06/2014	WH														
gez. 06/2014	Pollok														
Projekt:				Plan-Nr.:											
VDE 8.1 ABS Nürnberg – Ebensfeld				80002_2_B											
Strecke:				Planort:											
Strecke 5900, Nürnberg – Bamberg (Ebensfeld)				AUSFÜHRUNG											
Bauwerksnummer				Planzeichen:											
5900				Nlb											
Kilometer				Blattgr.: 985 x 640											
Kennzahl				Einwirkungen (Lastmodelle):											
5900				Höhen- und Koordinatensystem											
AP				DHHN 12 und DHDN											
811				Höhen- und Koordinatensystem											
17.11.9008.15				DHHN 12 und DHDN											
AP				Höhen- und Koordinatensystem											
811				Höhen- und Koordinatensystem											
17.11				Höhen- und Koordinatensystem											
