Skena Planungsgesellschaft mbH
Bergheimer Strasse 125
69115 Heidelberg

Markgrafentheater Erlangen
Umbau Orchesterpodium
Entwurf Rahmenterminplan

04.02.15
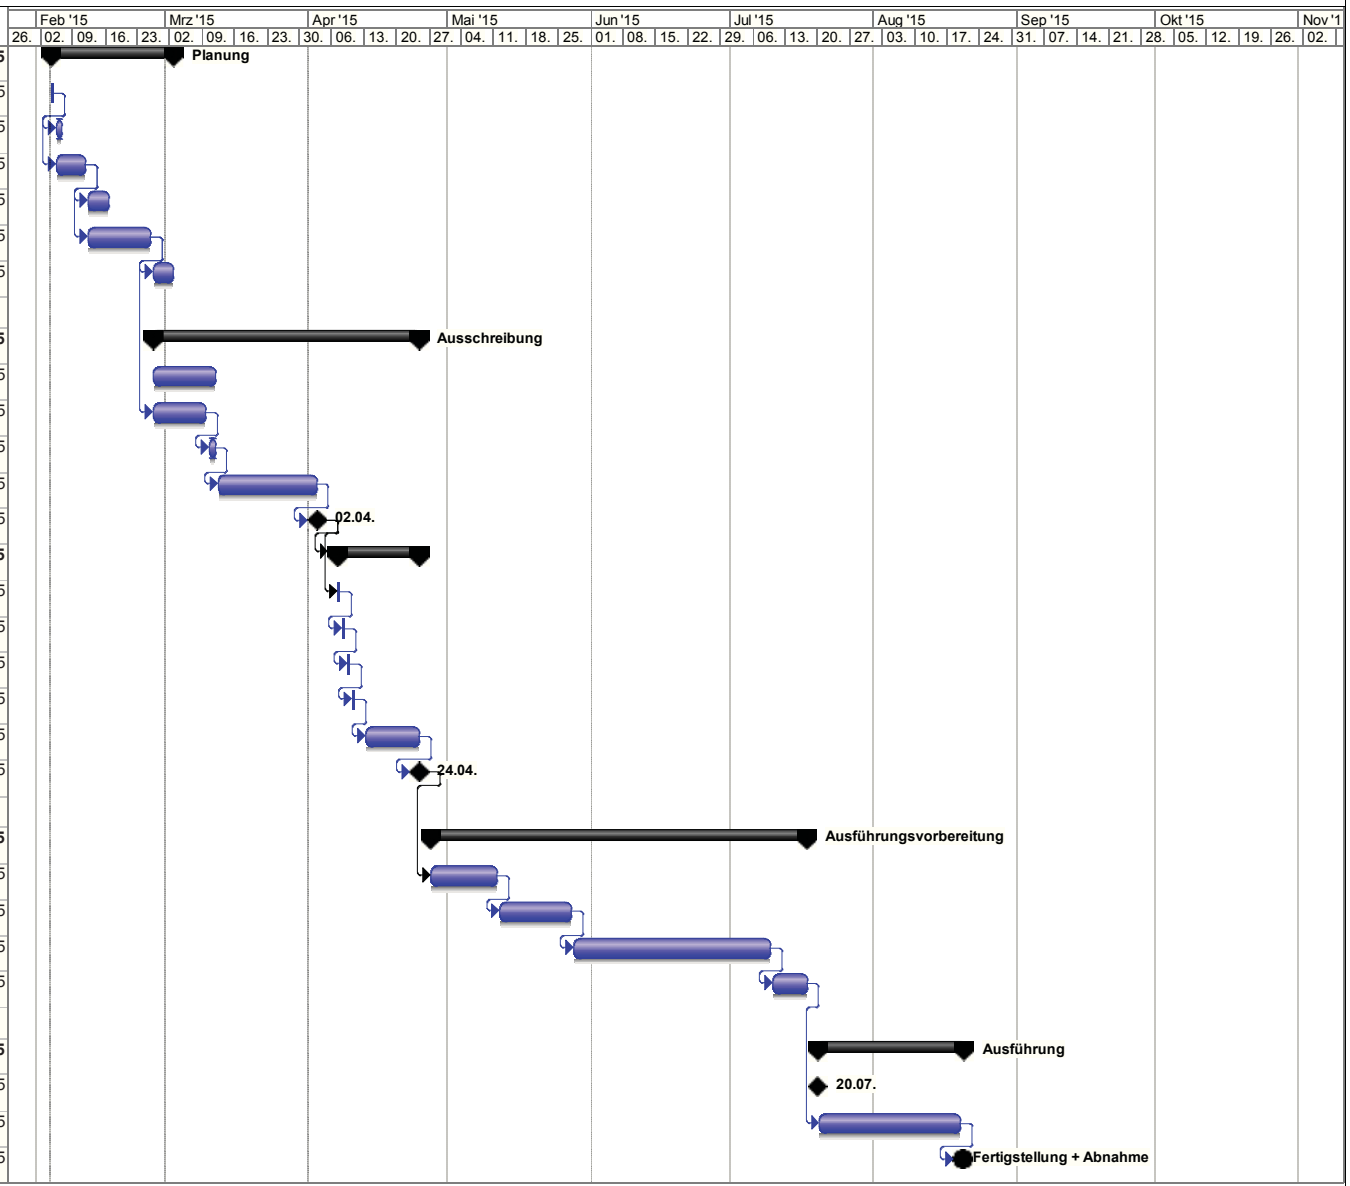
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	**Planung**	**19 Tage**	**04.02.15**	**02.03.15**
2	Vorplanung	1 Tag	04.02.15	04.02.15
3	Genehmigung der Vorplanung	2 Tage	05.02.15	06.02.15
4	Entwurfsplanung	5 Tage	05.02.15	11.02.15
5	Genehmigung der Entwurfsplanung	3 Tage	12.02.15	16.02.15
6	Ausführungsplanung	10 Tage	12.02.15	25.02.15
7	Genehmigung der Ausführungsplanung	3 Tage	26.02.15	02.03.15
8				
9	**Ausschreibung**	**40 Tage**	**26.02.15**	**24.04.15**
10	Vorlage Bekanntmachung / Veröffentlichung	2 Wochen	26.02.15	11.03.15
11	Erstellung der Leistungsverzeichnisse	8 Tage	26.02.15	09.03.15
12	Prüfung und Versand der Angebotsunterlagen	2 Tage	10.03.15	11.03.15
13	Angebotsbearbeitung durch Bieter (20 KT)	16 Tage	12.03.15	02.04.15
14	Ablauf der Angebotsfrist	0 Tage	02.04.15	02.04.15
15	**Zuschlagsfrist nach §18 VOB/A**	**14 Tage**	**07.04.15**	**24.04.15**
16	formelle / rechnerische Prüfung	1 Tag	07.04.15	07.04.15
17	technische / wirtschaftliche Prüfung	1 Tag	08.04.15	08.04.15
18	Aufklärungsgespräche	1 Tag	09.04.15	09.04.15
19	Vergabevorschlag, Absageschreiben	1 Tag	10.04.15	10.04.15
20	Wartefrist gem. §101a GWB	10 Tage	13.04.15	24.04.15
21	frühestmöglicher Auftragszeitpunkt	0 Tage	24.04.15	24.04.15
22				
23	**Ausführungsvorbereitung**	**56 Tage**	**27.04.15**	**17.07.15**
24	Erstellung der Werk- und Montagepläne	10 Tage	27.04.15	11.05.15
25	Planumlauf / Planprüfung / Bemusterung	10 Tage	12.05.15	27.05.15
26	Bestellung / Lieferzeit	30 Tage	28.05.15	09.07.15
27	Fertigung	6 Tage	10.07.15	17.07.15
28				
29	**Ausführung**	**24 Tage**	**20.07.15**	**20.08.15**
30	Beginn der Spielzeitpause	0 Tage	20.07.15	20.07.15
31	Umbau Orchesterpodium	23 Tage	20.07.15	19.08.15
32	Fertigstellung + Abnahme	1 Tag	20.08.15	20.08.15
